Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Planificación del Proyecto, Cronograma de Trabajo y EDT – Código EDT: 1.7

2. INTRODUCCIÓN

El aseguramiento del plazo de entrega en proyectos de software requiere una disciplina estricta de descomposición jerárquica del trabajo y secuenciación lógica de actividades. Tomando como base los lineamientos del Project Management Institute (PMI) y la metodología ágil Scrum, este informe formaliza la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) compuesta por 49 tareas estructuradas en 5 fases, y el Cronograma Maestro oficial configurado en Microsoft Project bajo el calendario laboral de la ciudad de Ambato, totalizando 57 días laborables y 456 horas netas de ingeniería.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Estructurar la planificación temporal y metodológica integral del proyecto SIGE mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) de 49 tareas y el Cronograma Maestro en Microsoft Project, estableciendo la línea base del proyecto.

3.2. Objetivos Específicos

- Descomponer el proyecto en 49 tareas organizadas en 5 fases secuenciales e iterativas.
- Configurar el calendario laboral oficial de Ambato/Ecuador (lunes a viernes, 8 horas/día, excluyendo feriados nacionales).
- Determinar el camino crítico (Critical Path), las holguras y la asignación del 100 % de recursos del equipo.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Planificación desde el 12 de agosto de 2026 hasta el 30 de octubre de 2026.
- 5 fases: Análisis, Arquitectura, Desarrollo Core, Pruebas/QA y Cierre/Despliegue.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Mantenimientos evolutivos posteriores a la fecha de entrega-recepción del 30 de octubre de 2026.

5. DEFINICIONES

- **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo):** Descomposición jerárquica orientada a entregables del trabajo que ejecutará el equipo del proyecto.
- **Línea Base del Cronograma:** Versión aprobada del modelo de programación que solo puede modificarse mediante procedimientos formales de control de cambios.
- **Ruta Crítica (CPM):** Secuencia de actividades que determina la duración total mínima del proyecto; no tiene holgura.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 1.7):** Elaboración del cronograma en Microsoft Project, cálculo de holguras y gestión del tiempo.
- **Equipo SIGE (HV, NH, AV):** Estimación de esfuerzo por paquete de trabajo y compromiso de entregas.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la línea base del cronograma.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Practice Standard for Work Breakdown Structures (PMI).**
- **Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y Código de Trabajo de Ecuador:** Calendario de feriados nacionales obligatorios.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó Microsoft Project con calendario laboral de 40 horas semanales. En las Figuras 1 y 2 se aprecian el diagrama general por fases y el cronograma detallado.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Resumen de Fases y Distribución de Esfuerzo

9.2. Hitos Clave del Proyecto (Milestones)

- **Hito 1 (24 ago):** Aprobación de Fase 1 y Paquete Entregables Semana 1.

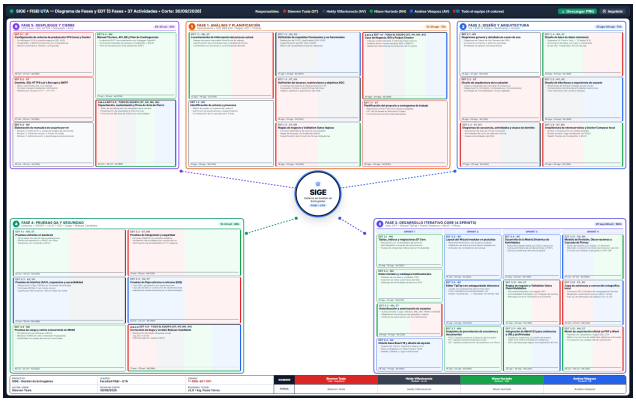


Figura 1: Diagrama Gantt de las 5 Fases del Proyecto SIGE.

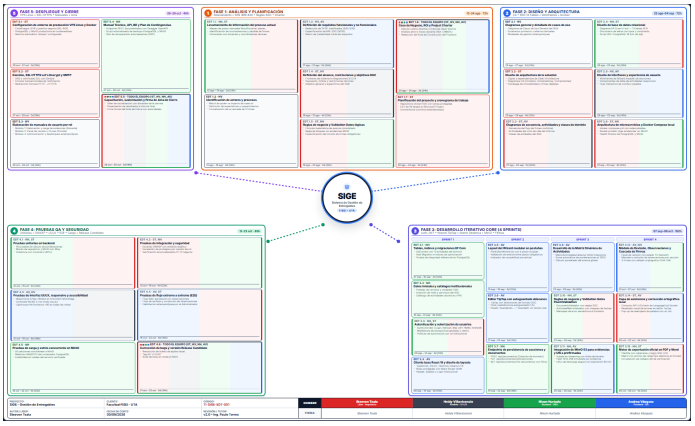


Figura 2: Cronograma Maestro Detallado y Ruta Crítica del Proyecto SIGE.

Fase	Denominación de Fase	Fechas	Días	Horas	% Esfuerzo	
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago - 24 ago	9	72 h	15,8 %	
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	25 ago - 04 sep	9	72 h	15,8 %	
Fase 3	**Desarrollo Core**	07 sep - 08 oct	24	192 h	42,1 %	
Fase 4	**Pruebas y Control de Calidad**	12 oct - 23 oct	10	80 h	17,5 %	
Fase 5	**Despliegue y Cierre**	26 oct - 30 oct	5	40 h	8,8 %	
	TOTAL GENERAL:	**12 ago - 30 oct**	**57**	**456 h**	**100.0 %**	

Tabla 1: Distribución de Esfuerzo y Tiempos por Fase del Proyecto.

- **Hito 2 (04 sep):** Aprobación de Arquitectura y Entregable General Semana 2.
- **Hito 3 (22 sep):** Sprint 2 Review: Wizard y Persistencia Operativa.
- **Hito 4 (30 sep):** Sprint 3 Review: Matriz Dinámica y Evidencias MinIO.
- **Hito 5 (08 oct):** Sistema Core Completado (Code Freeze previo a feriado de 9 de octubre).
- **Hito 6 (23 oct):** Aceptación de QA y Release Candidate v1.0-RC.
- **Hito 7 (30 oct):** Cierre Formal del Proyecto y Sistema en Producción.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	24/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Archivo Oficial `Cronograma_SIGE_Oficial.mpp` (Microsoft Project).
